

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Obsługa sceny**
Oznaczenie arkusza: **AUD.06-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **AUD.06**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA

2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

–

Kod egzaminatora

Data egzaminu

DzieńMiesiącRok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

:

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Dobrane elementy systemu elektroakustycznego

1	Dla wokalistów zostały dobrane mikrofony dynamiczne o charakterystyce kierunkowej kardioidalnej/superkardioidalnej.						
2	Do nagłośnienia sygnału z gitary elektroakustycznej został zastosowany DI - Box.						
3	Do nagłośnienia KICK został dobrany mikrofon dynamiczny niskotonowy.						
4	Do nagłośnienia SNARE TOP został dobrany mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej.						
5	Do nagłośnienia TOM 1 i 2 zostały dobrane mikrofony dynamiczne o charakterystyce kierunkowej kardioidalnej.						
6	Do nagłośnienia sygnału z OH zostały dobrane mikrofony pojemnościowe z małą kapsułą.						
7	Do nagłośnienia sygnału z gitary basowej został zastosowany DI - Box.						
8	Zostały przygotowane linie sygnałowe (okablowanie) dla mikrofonów przywożonych przez Zespół muzyczny.						
9	Do obsługi sygnału w torze monitorowym dla perkusisty został zastosowany wzmacniacz słuchawkowy.						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Ustawione elementy systemu elektroakustycznego						
1	Mikrofony dla wokalistów zostały umieszczone na statywach na wysokości powyżej 1,5 m i skierowane kapsułą w stronę wokalistów.					
2	Mikrofon dla KICK został ustawiony na niskim statywie i skierowany jest na wielki bęben.					
3	Mikrofony dla TOM 1 i 2 zostały ustawione na statywach i skierowane są kapsułami na membrany bębnów.					
4	Mikrofony dla OH zostały ustawione na statywach wysokich po obu stronach zestawu perkusyjnego i skierowane są kapsułami w stronę zestawu.					
5	Zostały ustawione statywy z okablowaniem dla mikrofonów przywożonych przez Zespół muzyczny zgodnie z przeznaczeniem.					
6	Kable sygnałowe zostały ułożone w sposób uporządkowany i nieutrudniający pracy na scenie.					
Rezultat 3: Konfiguracja i działanie systemu monitorowego sceny						
Uwaga: Rider techniczny zamieszczony jest na ostatnich stronach zasad oceniania						
1	Stanowisko realizatora monitorów zostało zlokalizowane poza obrysem sceny i skierowane jest w jej kierunku.					
2	Splitter został zlokalizowany z boku sceny w pobliżu konsoli monitorowej.					
3	Wszystkie sygnały ze źródeł dźwięku zostały skierowane do konsoli monitorowej poprzez splitter, a z konsoli monitorowej do monitorów scenicznych/słuchawek.					
4	Zostały podłączone sygnały foniczne do konsoli monitorowej zgodnie z informacją zawartą w riderze technicznym.					
5	Nie występuje przesterowanie torów sygnałowych konsoli monitorowej.					
6	Monitory sceniczne zostały ustawione zgodnie z planem sceny w kierunku wykonawców.					
7	Monitory sceniczne i słuchawki perkusisty emitują sygnały zgodnie z informacją zawartą w riderze technicznym.					
8	Nie występują sprzężenia zwrotne w torach elektroakustycznych sceny.					

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Konfiguracja i działanie systemu zasilania sceny							
1	Wszystkie urządzenia podłączone są do jednej linii zasilającej.						
2	Liczba punktów zasilania jest zgodna z informacją zawartą w riderze technicznym (4 na scenie + 1 na stanowisku monitorowym).						
3	Każdy punkt zasilania jest zrealizowany z linią PE.						
4	Kable zasilające zostały ułożone w sposób uporządkowany i nieutrudniający pracy na scenie.						
Przebieg 1: Przebieg wykonania montażu, uruchomienia systemu oraz wykonywania pomiarów. <i>Uwaga, przy dokonywaniu oceny wykonywania pomiarów należy obserwować czy zdający używał właściwych funkcji miernika (omomierz lub wskaźnik ciągłości w przypadku sprawdzania kabli oraz woltomierz w przypadku pomiaru napięcia zasilającego). W przypadku zamiaru wykonania pomiaru napięcia zasilającego w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub mogący spowodować uszkodzenie miernika przez dobór nieprawidłowej funkcji lub zakresu pomiarowego, egzaminator powinien uniemożliwić dokonanie tego pomiaru i jednocześnie kryteria P.1.2 oraz P.1.4 uznać za niespełnione.</i>							
Zdający:							
1	przetestował sprawność kabli doprowadzających sygnały z mikrofonów wokalistów do splittera przy pomocy miernika uniwersalnego.						
2	sprawdził napięcie w gniazdach zasilających przy użyciu miernika uniwersalnego.						
3	przystąpił do uruchamiania systemu dopiero po uzyskaniu zgody egzaminatora.						
4	wykonując prace nie doprowadził do sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu lub uszkodzeniu urządzeń.						

Egzaminator


imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

RIDER TECHNICZNY (AKUSTYCZNIĘ)

Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom dźwięku przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym. Wszelkie odstępstwa od postanowień w nim zawartych wymagają potwierdzonej pisemnie, bądź elektronicznie, zgody przedstawiciela Zespołu muzycznego w osobie Realizatora lub Managera.

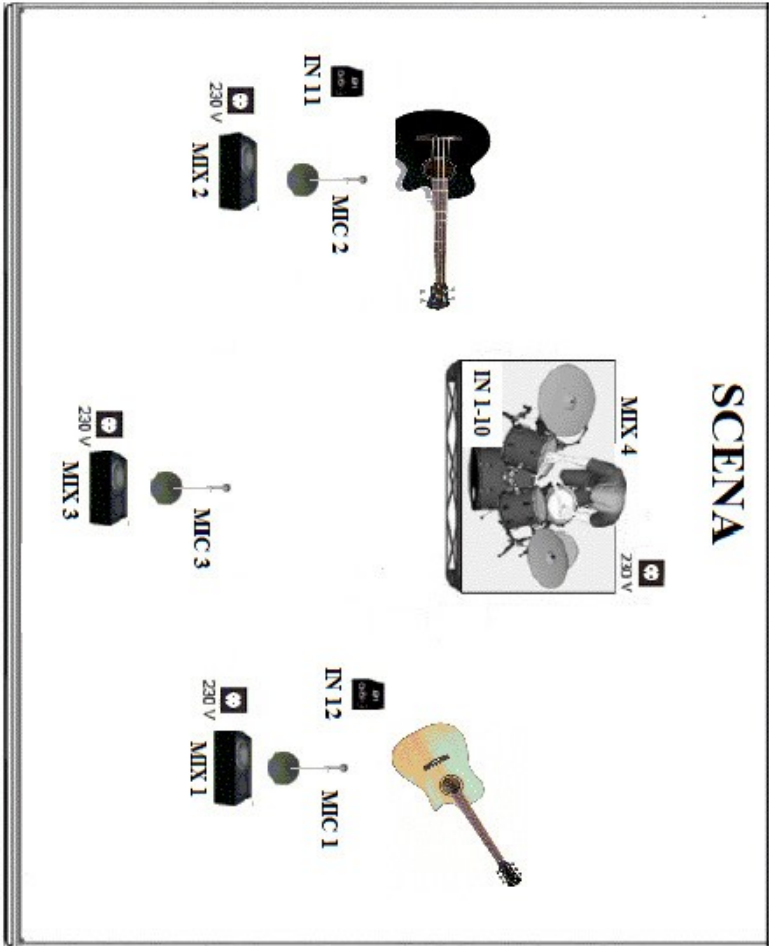

Rysunek 1. Plan sceny

Tabela 1. Input list

IN	ŹRÓDŁO	MIKROFON	STATYW
1.	KICK	Dynamiczny typu SM BETA 52	niżki
2.	SNARE TOP	Dynamiczny typu SM 57	niżki
3.	HI-HAT	WŁASNY	
4.	TOM 1	Dynamiczny o charakterystyce kardoidalnej	wysoki
5.	TOM 2	Dynamiczny o charakterystyce kardoidalnej	wysoki
6.	RIDE	WŁASNY	
7.	CRASH L	WŁASNY	
8.	CRASH R	WŁASNY	
9.	OHL	pojemnościowy typu SM81	wysoki
10.	OH R	pojemnościowy typu SM81	wysoki
11.	BASS	DI-Box	
12.	GIT	DI-Box	
13.	MIC 1	Dynamiczny typu SM BETA 58A	wysoki
14.	MIC 2	Dynamiczny typu SM BETA 58A	wysoki
15.	MIC 3	Dynamiczny typu SM BETA 58A	wysoki

UWAGI OGÓLNE

- Całość aparatury powinna być zmontowana, sprawdzona i gotowa do pracy przed planowanym przybyciem Zespołu muzycznego na próbę.
- Prosimy o zapewnienie, bezpośrednio przy stole monitorowym, jednego gniazda zasilającego 230 V.

SCENA

- Scena powinna być stabilna.
- Minimalny wymiar sceny: 5 m x 3 m.

SYSTEM MONITOROWY

- Stanowisko pod stół monitorowy powinno znajdować się poza obszarem sceny, na równej wysokości z nią, w miejscu umożliwiającym kontakt wzrokowy realizatora z każdym z muzyków.
- Sygnały do konsoly MON prowadzimy ze splittera zlokalizowanego w pobliżu konsoly.

Tabela 2. Konfiguracja torów monitorowych

MIX 1	WEDGE: IN 1, IN 2, IN 11, IN 12, MIC 3, MIC 1
MIX	WEDGE: IN 1, IN 2, IN 11, IN 12, MIC 3, MIC 2
MIX	WEDGE: IN 1, IN 2, IN 11, IN 12, MIC 3,
MIX 4	Stuchawki: IN 1, IN 2, IN 11, IN 12, MIC 3

ZASILANIE

- System (aparatura + sprzęt muzyków) musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy – adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.
- Rozmieszczenie przyłączy zaznaczone jest na planie sceny.
- Urządzenia zasilające – piony, rozdzielnie, podrozdzielnie muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do eksploatacji.
- Bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.
- Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu wykonawców bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo zespołu, oraz ekipy technicznej podczas prób i koncertu.
