



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż systemów suchej zabudowy**
Oznaczenie arkusza: **B.05-01-19.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.05**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający – wykonując zadanie egzaminacyjne – uzyskuje rezultaty w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie i z poleceniami zawartymi w treści zadania, to oceniaj jego działania pozytywnie oraz niezwłocznie zawiadom OKE, że zasady oceniania tego nie przewidują, mimo, że powinny.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonywaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1. Ruszt z profili stalowych pod okładzinę ścienną							
<i>Uwaga! Oceny rezultatu należy dokonać po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN gotowości do oceny</i>							
1	Prawa krawędź rusztu (skrajny profil CD 60) wykonana w odległości 140 cm od narożnika ± 2 cm						
2	Górna krawędź rusztu (poziomy profil UD 30) wykonana na wysokości 120 cm od podłogi ± 2 cm						
3	Profile UD 30 stykające się ze ścianą, podłogą i zestawem podtynkowym oklejone taśmą akustyczną						
4	Profile UD 30 zamocowane do ściany i podłogi kołkami rozporowymi SM 6 x 60 mm w rozstawie nie przekraczającym 50 cm						
5	Profile UD 30 zamocowane do zestawu podtynkowego WC wtrętami TM 3,5 x 25 mm w rozstawie nie przekraczającym 25 cm						
6	Profile CD 60 zamontowane o rozstawie zgodnym z rysunkiem ± 1 cm						
7	Profile CD 60 zamontowane w pionie z dopuszczalnym odchyleniem ± 1 cm na całej wysokości rusztu						
8	Górny profil UD 30 zamontowany w poziomie z dopuszczalnym odchyleniem ± 1 cm na całej szerokości rusztu						
9	Ruszt licowany z zestawem podtynkowym $\pm 0,5$ cm						

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Pierwsza warstwa opłytywania*Uwaga! Oceny rezultatu należy dokonać po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN gotowości do oceny*

1	Płyty przykręcone zgodnie ze schematem opłytywania						
2	Płyty przykręcone do każdego profilu rusztu wkrętami TM 3,5 x 25 mm						
3	Rozstaw wkrętów wynosi 50 cm $\pm$ 3 cm						
4	Otwory instalacyjne w płycie pasują do otworów zestawu podtynkowego $\pm$ 1,5 cm						
5	Pomiędzy płytą a podłogą pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości 0,5÷1,0 cm						
6	Łby wkrętów nie przebijają kartonu płyty						
7	Łby wkrętów nie wystają poza lico płyty						
8	Prawa krawędź płyty wykonana w pionie z dopuszczalnym odchyleniem $\pm$ 1 cm na całej wysokości płyty						
9	Górna krawędź opłytywania wykonana w poziomie z dopuszczalnym odchyleniem $\pm$ 1 cm na całej szerokości okładziny						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Druga warstwa opłytywania

1	Płyty przykręcone zgodnie ze schematem opłytywania						
2	Płyty przykręcone do każdego profilu rusztu wkrętami TM 3,5 x 35 mm						
3	Rozstaw wkrętów wynosi 25 cm $\pm$ 3 cm						
4	Otwory instalacyjne w płycie pasują do otworów zestawu podtynkowego $\pm$ 1,5 cm						
5	Pomiędzy płytą a podłogą pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości 0,5÷1,0 cm						
6	Łby wkrętów nie przebijają kartonu płyty						
7	Łby wkrętów nie wystają poza lico płyty						
8	Prawa krawędź płyty wykonana w pionie z dopuszczalnym odchyleniem $\pm$ 1 cm na całej wysokości płyty						
9	Górna krawędź opłytywania wykonana w poziomie z dopuszczalnym odchyleniem $\pm$ 1 cm na całej szerokości okładziny						

Przebieg 1. Wykonanie okładziny ściennej*Zdający:*

1	stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem						
2	miał założone okulary ochronne podczas wiercenia otworów w podłożu						
3	miał założone rękawice podczas przycinania profili rusztu						
4	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt						
5	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko pracy						
6	usunął odpady do odpowiednich pojemników						


Egzaminator

imię i nazwisko


.....

data i czytelny podpis

Widok rusztu okładziny

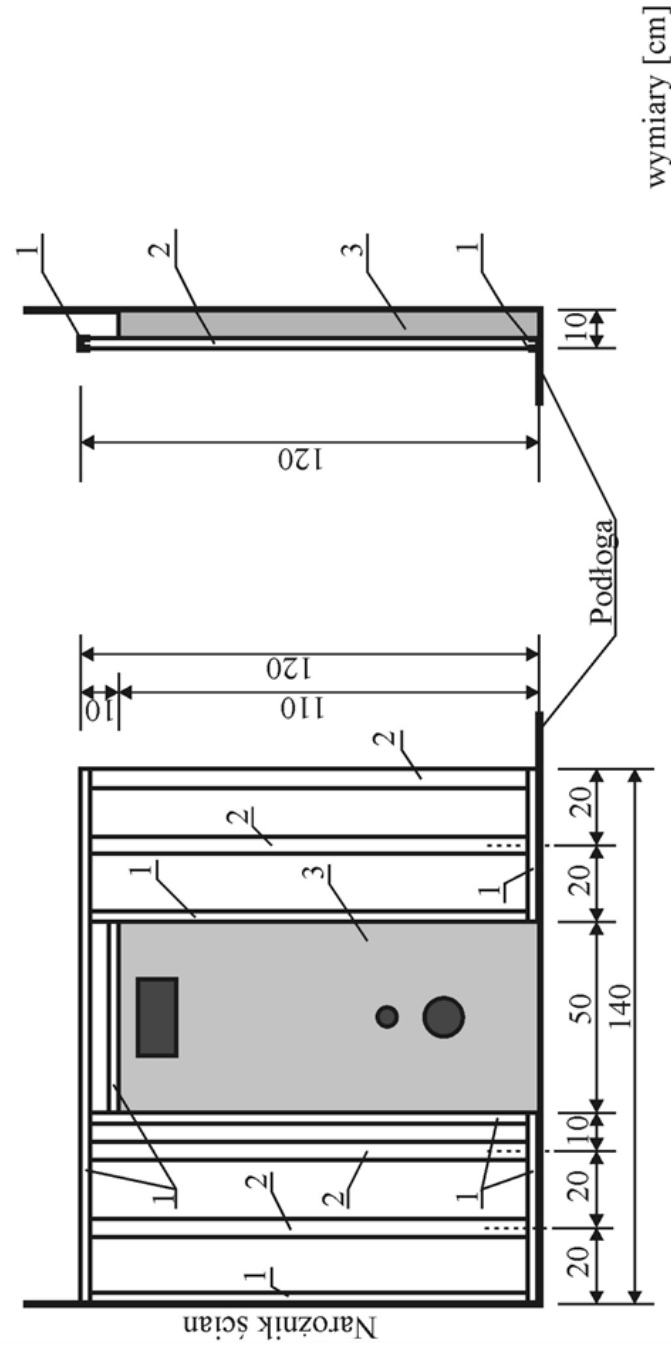

Schemat oplytowania

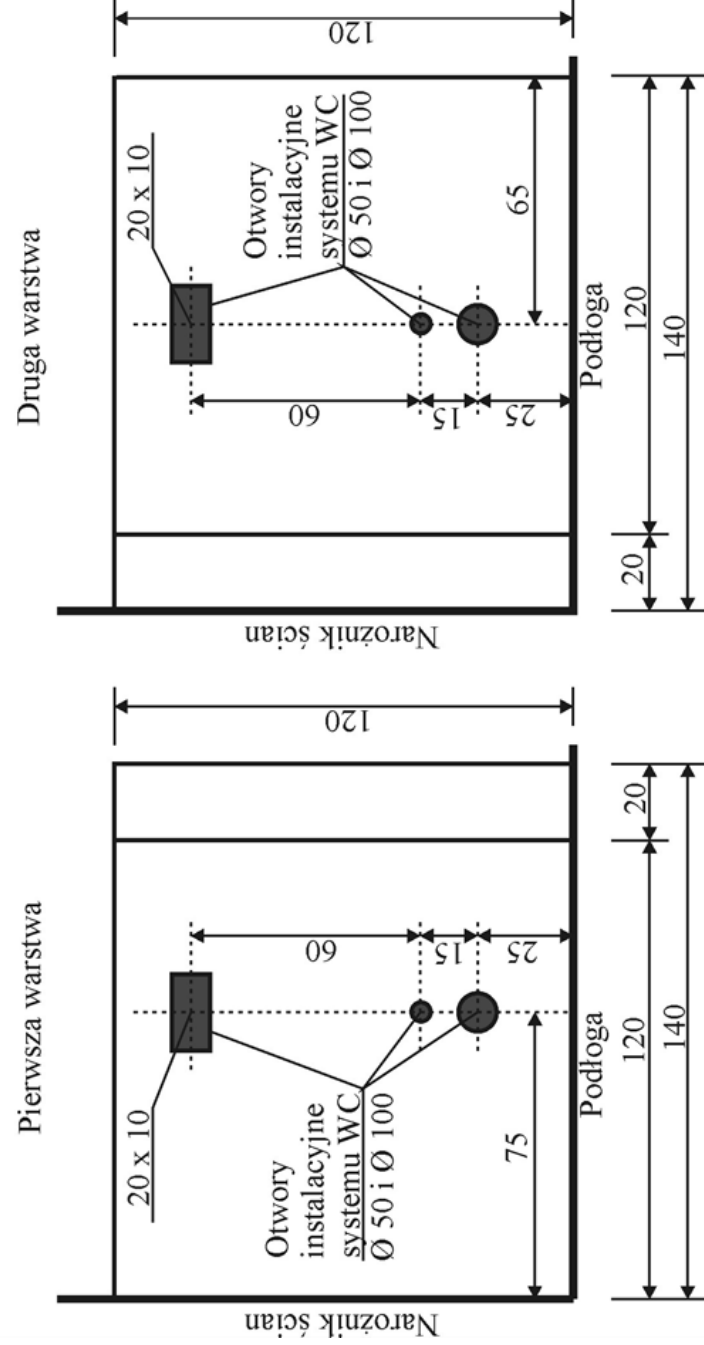

Rys. Konstrukcja okładziny ściiennej z podtynkowym systemem WC
