

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen**
Oznaczenie arkusza: **BUD.30-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **BUD.30**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

Dzień		Miesiąc		Rok			

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny							
Rezultat 1: Zagruntowana powierzchnia ściany pod powłokę z tapety							
<i>Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny</i>							
1	Przygotowane 3 bryty tapety zgodnie z rysunkiem 3						
2	Wyznaczona powierzchnia pod powłokę z tapety zgodna z rysunkiem 3						
3	Ściana zagruntowana pod powłokę tapeciarską na całej powierzchni przeznaczonej pod tapetę zgodnie z rysunkiem 3						
Rezultat 2: Powierzchnia ściany wykończona powłoką z tapety							
1	Dolna krawędź środkowego brytu przyklejonej tapety wykonana na wysokości 1000 mm ±10 mm od posadzki						
2	Górna krawędź przyklejonej tapety wykonana na wysokości 1500 mm ±10 mm od posadzki						
3	Lewa krawędź przyklejonej tapety wykonana 500 mm ±10 mm od lewej granicy stanowiska						
4	Prawa krawędź przyklejonej tapety wykonana 2060 mm ±10 mm od lewej granicy stanowiska						
5	Krawędzie powłoki tapeciarskiej wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka ±3 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
6	Górna krawędź tapetowanego fragmentu wykonana w poziomie, dopuszczalna odchyłka ±3 mm/1 m						
7	Krawędzie (lewa i prawa) tapetowanego fragmentu wykonane w pionie, dopuszczalna odchyłka ±3 mm/1 m						
8	Tapeta przyklejona na całej powierzchni podłoża, nie występują uszkodzenia (nie występują prześwity podłoża)						
9	Na powierzchni tapeciarskiej nie występują pęcherze, zmarszczenia						
10	Na powierzchni tapeciarskiej nie występują zabrudzenia klejem						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Ruszt okładziny podestu						
Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny						
1	Narożnik rusztu podestu usytuowany w odległości 1020 mm od ściany bocznej, dopuszczalne odchylenie ± 10 mm					
2	Wysokość rusztu wynosi 987,5 mm, dopuszczalne odchylenie ± 10 mm					
3	Wymiary poziome rusztu podestu: w kierunku równoległym do ściany 495 mm, w kierunku prostym do ściany 507,5 mm, dopuszczalne odchylenie ± 10 mm					
4	Profile przypodłogowe UW oraz profile przyściennne CW podklejone taśmą akustyczną					
5	Profile UW zamocowane do podłogi dwoma kołkami rozporowymi szybkiego montażu					
6	Profile CW trwale połączone z profilami UW przez zaciśnięcie					
7	Profile CW zamocowane do ścian kołkami rozporowymi, rozstaw kołków nie przekracza 500 mm					
8	Profile zamocowane do ściany pewnie i stabilnie (nie ma możliwości poruszenia nimi podczas próby przesunięcia ręką)					
9	Profile CW zamocowane w obu kierunkach w pionie, dopuszczalne odchylenie ± 3 mm/1m					
10	Górna krawędź rusztu wykonana w poziomie, dopuszczalne odchylenie ± 3 mm/1m					

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Opłytywanie z płyt gipsowo-kartonowych rusztu podestu							
1	Płyty gipsowo-kartonowe montowane do każdego profilu wkrętami TN 3,5 x 25 mm						
2	Rozstaw wkrętów TN wynosi 250 mm, dopuszczalne odchylenie ±30 mm						
3	Pomiędzy posadzką a płytą gipsowo-kartonową pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości 5÷10 mm						
4	Szczeliny na styku płyt gipsowo-kartonowych oraz na styku płyt ze ścianą nie przekraczają 5 mm						
5	Łby wkrętów TN nie przebijają kartonu płyty gipsowo-kartonowej						
6	Łby wkrętów TN nie wystają poza lico płyty gipsowo-kartonowej						
7	Pionowa krawędź opłytywania wykonana w pionie, dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego ±3 mm/1 m						
8	Górna pozioma płaszczyzna opłytywania wykonana w poziomie, dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego ±3 mm/1 m						
9	Płaszczyzny zabudowy wykonane względem siebie pod kątem prostym, dopuszczalne odchylenie ±5 mm/1 m						
10	Płaszczyzny zabudowy wykonane względem ścian pod kątem prostym, dopuszczalne odchylenie ±5 mm/1 m						
Przebieg 1: Tapetowanie ściany							
Zdający:							
1	gruntował ścianę pod powłokę tapeciarską pędzlem						
2	składał bryty tapety po posmarowaniu ich klejem						
3	po złożeniu brytów tapety odczekał przed ich przyklejeniem						
4	używał liniału lub kątownika oraz noża do cięcia tapety						
5	kontrolował pion i poziom przy użyciu poziomnicy						
6	usuwał pęcherze bawełnianą szmatką						
7	dociskał tapetę do ściany za pomocą wałka gumowego						
8	przełwał resztki kleju do odpowiednio oznaczonego pojemnika						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonanie zabudowy podestu

Zdający:


1	kontrolował pion i poziom podestu przy użyciu poziomnicy						
2	przycinał profile nożycami do cięcia blachy						
3	łączył profile zaciskarką do profili						
4	montował wkręty TN za pomocą wkrętarki z końcówką do wkrętów						
5	podczas przycinania i montowania profili miał założone rękawice ochronne						
6	podczas wiercenia otworów miał założone okulary ochronne						
7	do uzyskania szczeliny dylatacyjnej pomiędzy posadzką, a płytą gipsowo-kartonową stosował kliny (podkładki) dystansowe						
8	oczyścił narzędzia i sprzęt po zakończeniu robót						
9	uporządkował stanowisko pracy po zakończeniu robót						
10	posegregował odpady i umieścił je w odpowiednich pojemnikach						

Egzaminator

imię i nazwisko


.....

data i czytelny podpis

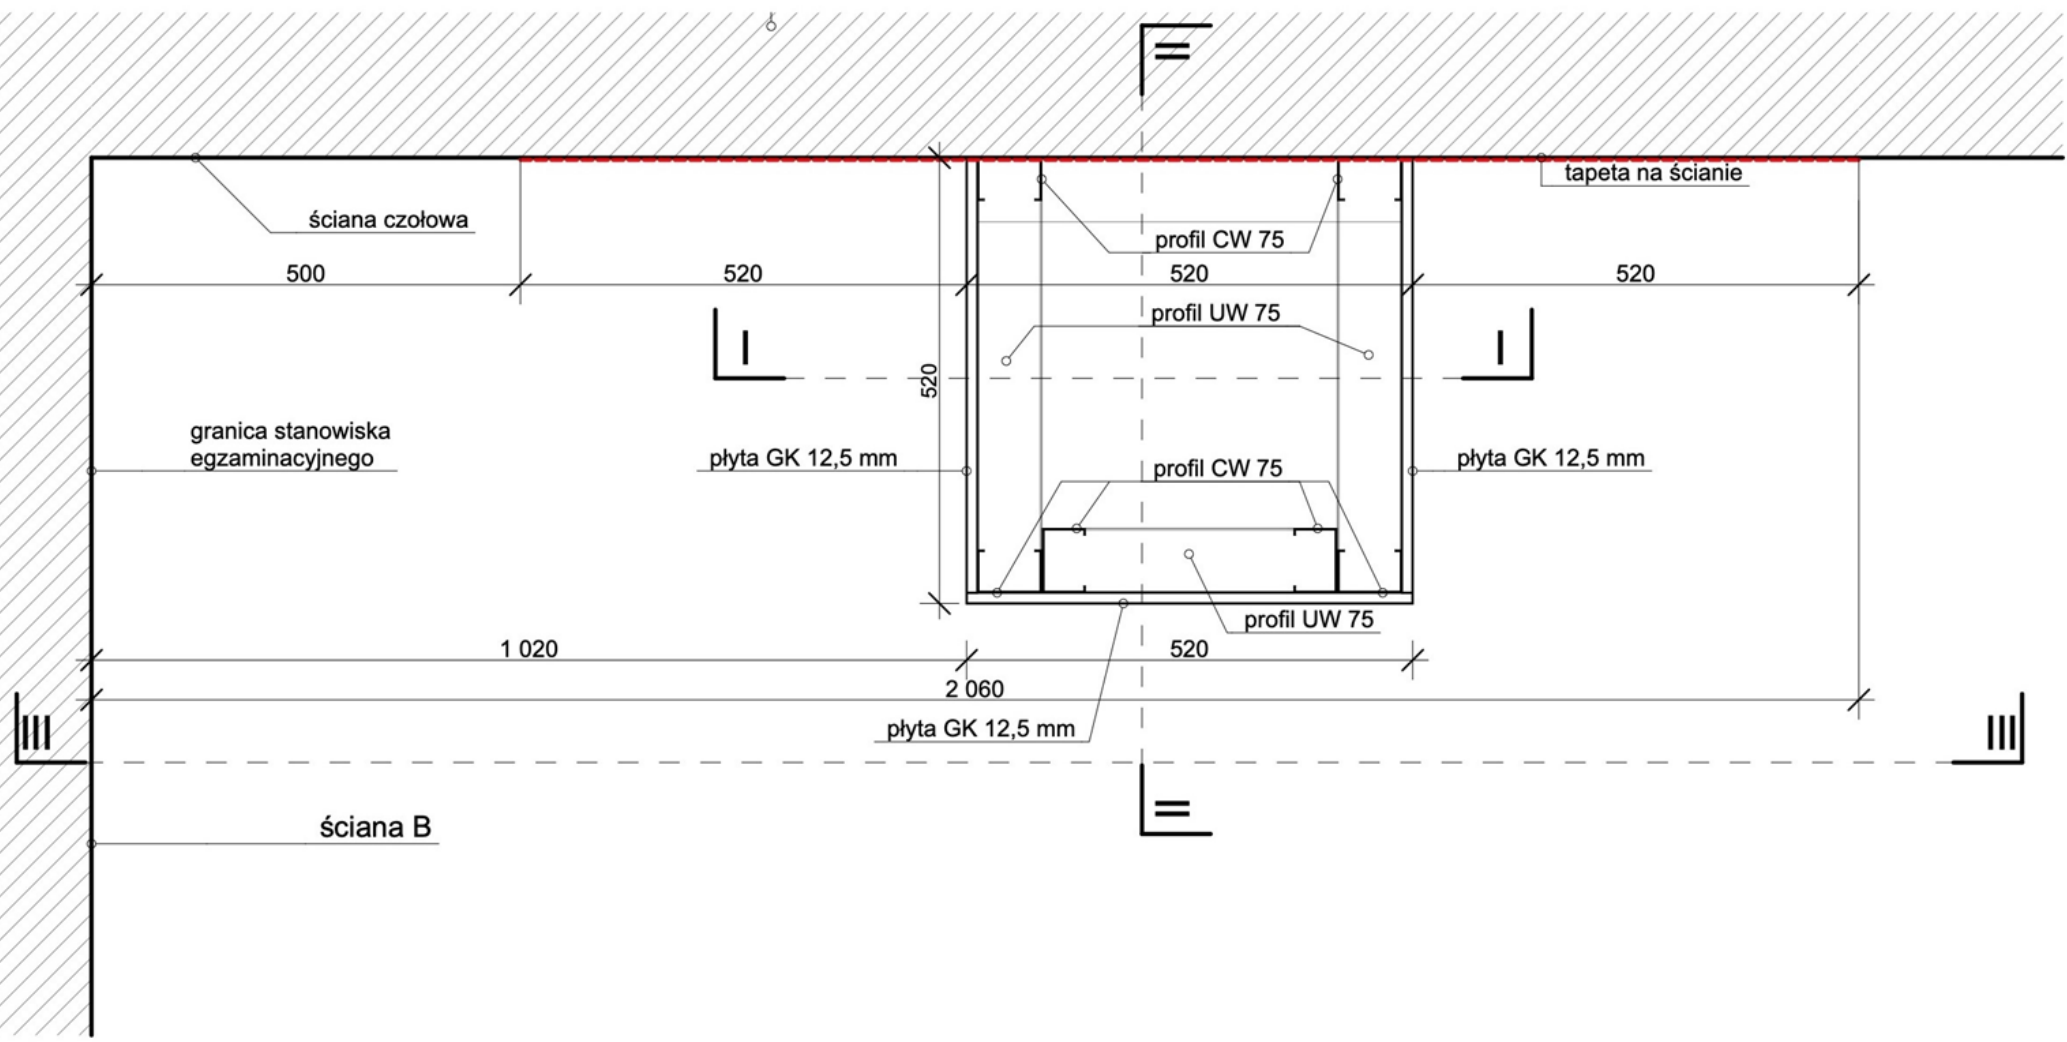


Rysunek 1. Konstrukcja podestu – rzut

Wymiary [mm]

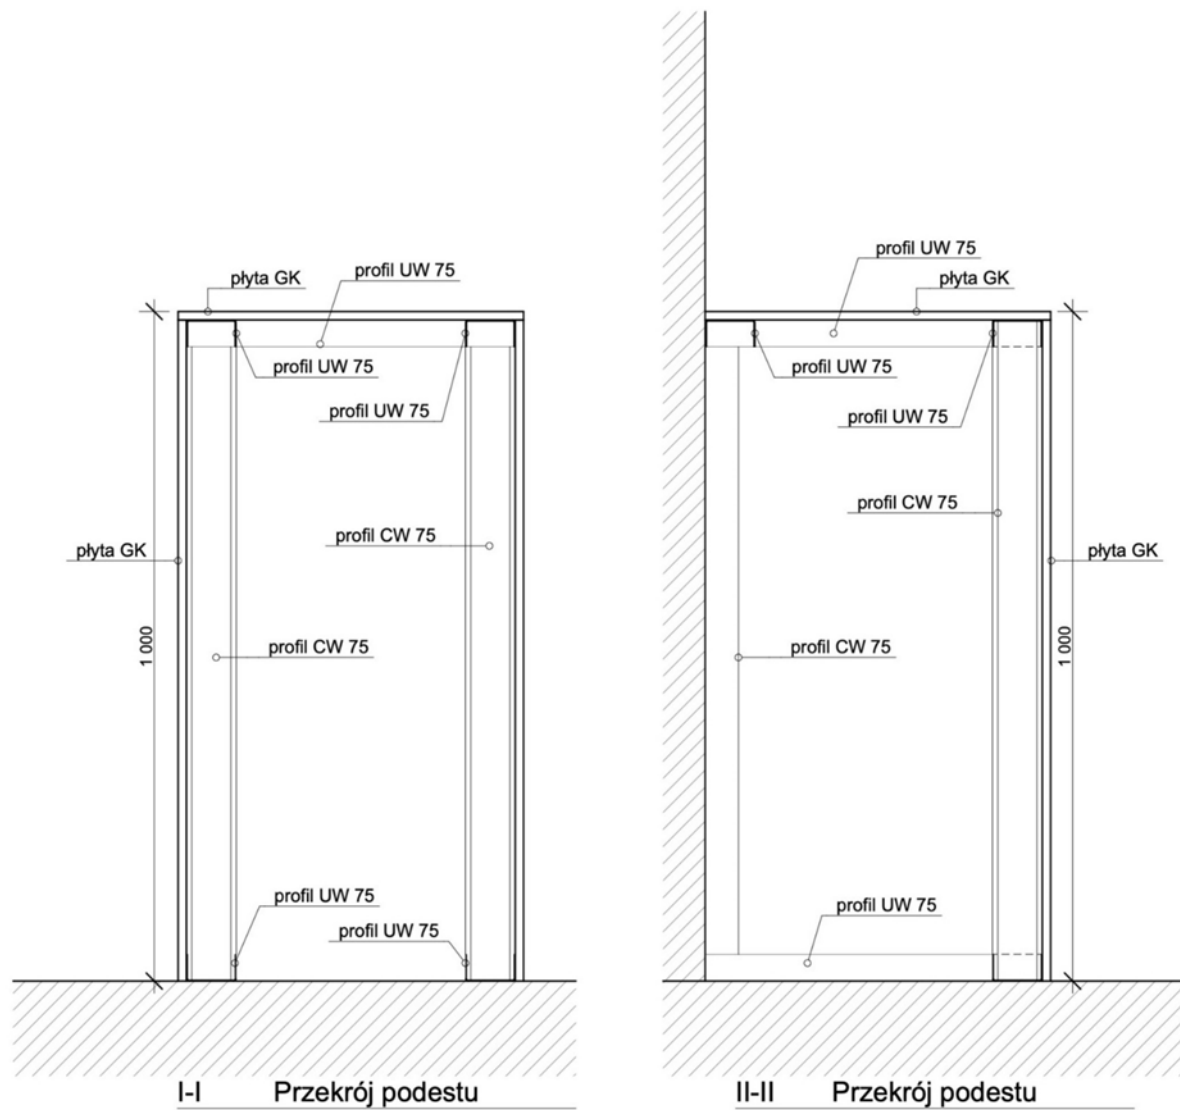

Wymiary [mm]

Rysunek 2. Konstrukcja podestu – przekroje (przekrój I – I, przekrój II – II)

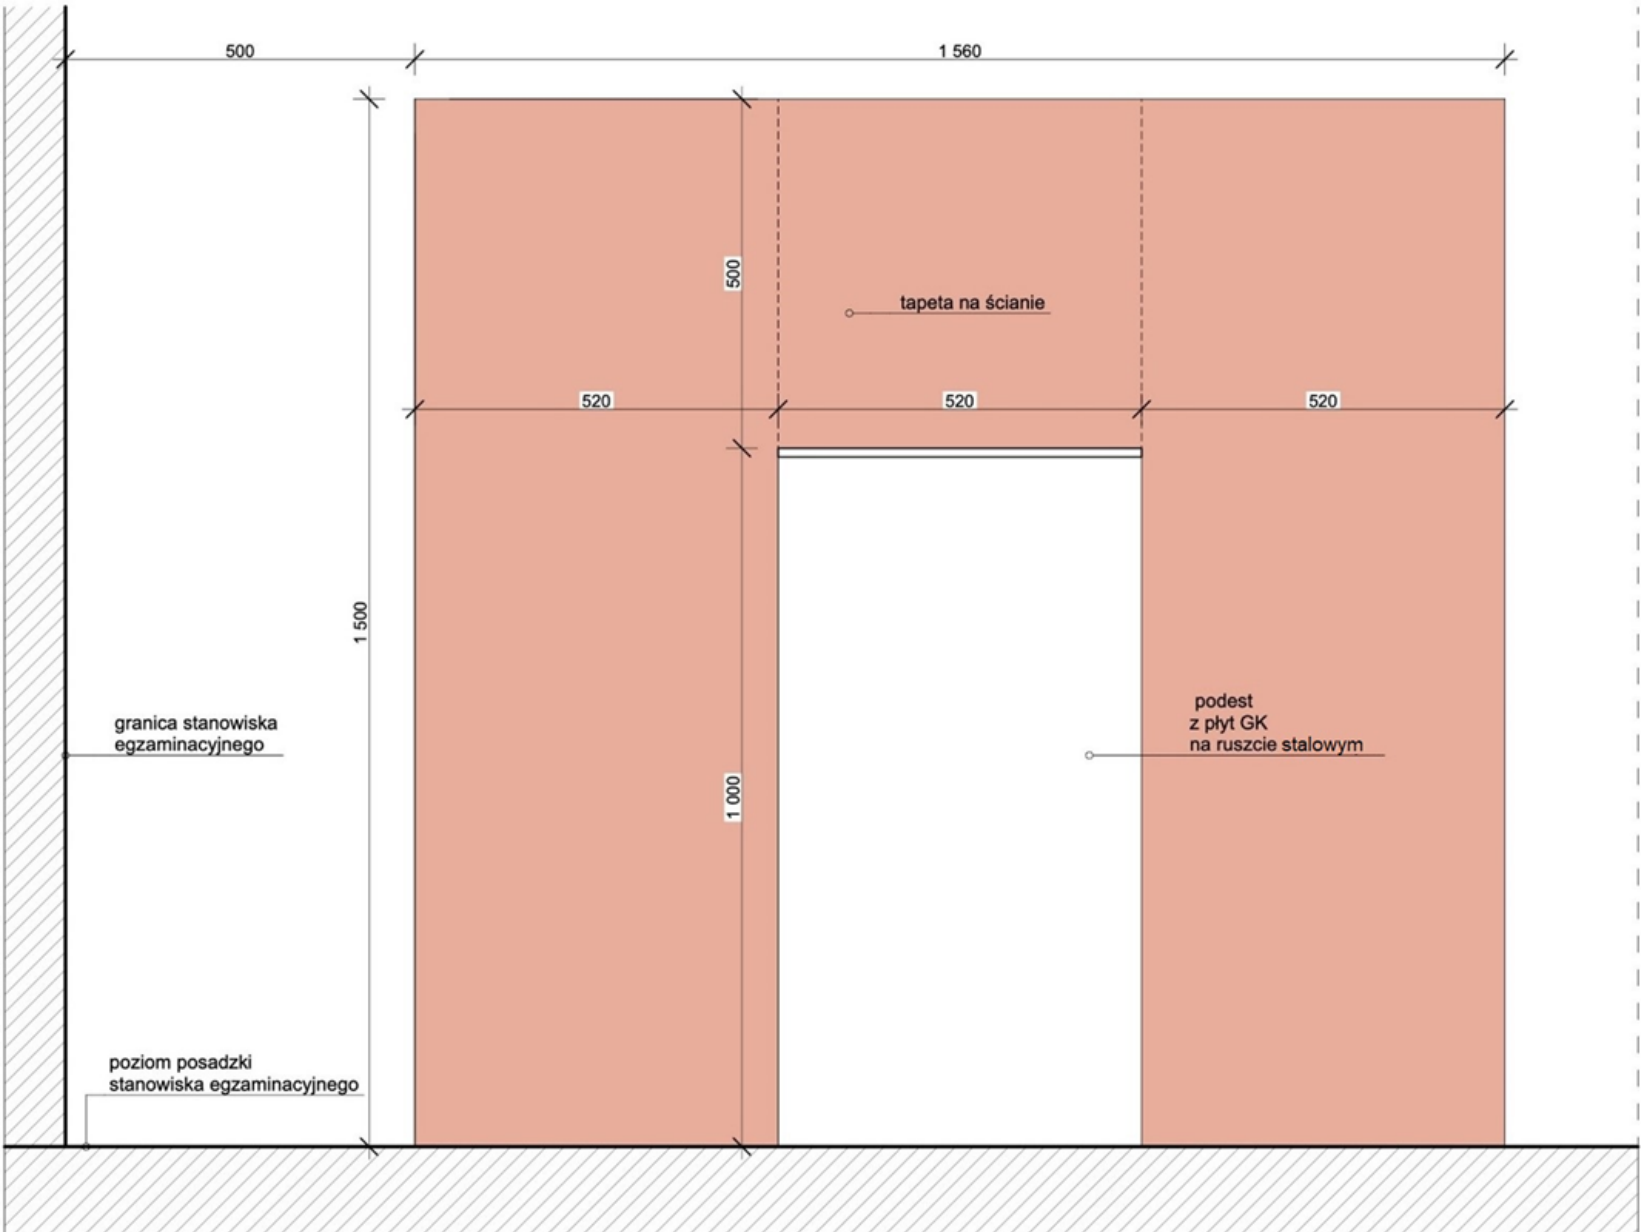

Wymiary [mm]

Rysunek 3. Widok podestu - przekrój (przekrój III – III)
