



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen**
Oznaczenie arkusza: **BUD.30-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **BUD.30**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Ruszt ściany działowej

Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny

1	Profile UW75 podklejone taśmą akustyczną						
2	Profile UW75 zamocowane stabilnie do podłoża kołkami SM 8 x 60 mm w rozstawie nieprzekraczającym 500 mm						
3	Profile CW75 podklejone taśmą akustyczną						
4	Profile CW75 zamocowane stabilnie do podłoża kołkami SM 8 x 60 mm w rozstawie nieprzekraczającym 500 mm						
5	Ruszt wykonany z profili UW75 i CW75 zgodnie z Rysunkiem 1 i 2						
6	Wysokość rusztu 1 200 mm ± 20 mm						
7	Profile CW75 zamocowane w pionie, dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego nie większe niż ±10 mm						
8	Profile UW75 zamontowane w poziomie, dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego nie większe niż ±10 mm						
9	Profile UW75 zamontowane w poziomie, dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego nie większe niż ±10 mm						
10	Ruszt zabudowy wykonany pod kątem prostym w stosunku do istniejącej ściany, dopuszczalne odchylenie od kąta prostego nie większe niż 5 mm na długości wykonanej ściany						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Opłytywanie ściany działowej						
1	Pozostawiona szczelina dylatacyjna pomiędzy podłogą a płytami gipsowo-kartonowymi					
2	Płyty G-K1 ÷ G-K3 o wymiarach zgodnych z Rysunkiem 3 dopuszczalne odchylenie wymiarów ± 20 mm					
3	W płytach G-K1 i G-K2 wykonane otwory o średnicy 90 mm					
4	Otwory w płytach G-K1 i G-K2 rozmieszczone zgodnie z Rysunkiem 3					
5	Płyty przykręcone do profili wkrętami 3,5 x 25 mm w rozstawie 250 mm ± 20 mm					
6	Górne krawędzie płyt zlicowane z górnymi profilami UW75 zgodnie z Rysunkiem 2					
7	Boczne opłytywanie (płyty G-K1 i G-K2) zlicowane z profilem CW75 zgodnie z Rysunkiem 1					
8	Płyta G-K3 zlicowana z bocznymi płytami ścianki zgodnie z Rysunkiem 3					
9	Narożnik zewnętrzny klejony na wysokość ścianki działowej					
10	Łby wkrętów nie wystają poza lico płyty gipsowo-kartonowej					

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Powłoka malarska							
1	Dolna krawędź odcięcia powłoki wykonana na wysokości 300 mm ± 10 mm od poziomu podłogi						
2	Górna krawędź odcięcia powłoki wykonana na wysokości 1 200 mm ± 10 mm od poziomu podłogi						
3	Prawa krawędź odcięcia powłoki wykonana wzdłuż płyty gipsowo-kartonowej zgodnie z Rysunkiem 2						
4	Lewa krawędź powłoki wykonana wzdłuż granicy stanowiska zgodnie z Rysunkiem 2						
5	Krawędzie poziome odcięcia powłoki wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka nie większa niż 2 mm/1 m						
6	Powłoka wykonana w kolorze jasnopomarańczowym na całej powierzchni przeznaczonej do malowania						
7	Brak smug i śladów pędzla						
8	Brak zacieków						
9	Brak prześwitów podłoża						
Rezultat 4: Okładzina z tapety							
1	Dolna krawędź tapety wykonana na wysokości 300 mm ± 10 mm od poziomu podłogi						
2	Górna krawędź tapety wykonana na wysokości 1 200 mm ± 10 mm od poziomu podłogi						
3	Lewa krawędź tapety wykonana wzdłuż płyty gipsowo-kartonowej zgodnie z Rysunkiem 2						
4	Prawa krawędź tapety wykonana w odległości 1 060 mm ± 10 mm od narożnika ścianki działowej zgodnie z Rysunkiem 3						
5	Dopuszczalne odchylenie krawędzi brytu tapety od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm/1 m						
6	Dopuszczalne odchylenie krawędzi brytów tapety od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm/1 m						
7	Tapeta przyklejona na całej powierzchni podłoża bez prześwitów podłoża na styku brytów						
8	Brak pęcherzy, zmarszczeń i uszkodzeń						
9	Brak zabrudzeń klejem						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie rusztu i opłytywania ściany działowej						
Zdający:						
1	kontrolował pion i poziom przy użyciu poziomnicy					
2	przycinał profile nożycami do cięcia blachy					
3	łączył profile zaciskarką do profili					
4	montował wkręty za pomocą wkrętarki z końcówką do wkrętów					
5	do uzyskania szczeliny dylatacyjnej pomiędzy podłogą a płytą gipsowo-kartonową stosował kliny (podkładki) dystansowe					
6	podczas wklejania narożników zewnętrznych masą szpachlową zapewnił jej wypłynięcie przez perforację otworów na całej ich powierzchni					
7	podczas przycinania i montowania profili miał założone rękawice ochronne					
8	podczas wiercenia otworów miał założone okulary ochronne					
9	utrzymywał porządek na stanowisku pracy, odkładał narzędzia tak, żeby nie stwarzały zagrożeń					

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonanie powłoki malarskiej

Zdający:

1	stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem						
2	kontrolował pion i poziom przy wynaczeniu powierzchni do malowania						
3	okleił taśmą malarską krawędź płyty G-K2						
4	okleił taśmą malarską obrys powierzchni ściany istniejącej stanowiska do malowania						
5	wymieszał farbę emulsyjną z pigmentem						
6	przelał resztki farby do odpowiednio oznaczonego pojemnika						
7	podczas malowania miał założone okulary ochronne						
8	oczyścił narzędzia i sprzęt po zakończeniu robót i uporządkował stanowisko pracy						
9	posegregował odpady i umieścił w odpowiednich pojemnikach						

Numer
stanowiska

Przebieg 3: Wykonanie okładziny z tapety

Zdający:


1	przygotował klej zgodnie z instrukcją producenta						
2	zagruntował ścianę pod tapetę przy użyciu pędzla						
3	odczekał przed przyklejeniem pasmarowanych klejem brytów zgodnie z instrukcją producenta						
4	przelał resztki kleju do odpowiedniego oznaczonego pojemnika						
5	oczyścił narzędzia i sprzęt po zakończeniu robót						
6	uporządkował stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko


.....

data i czytelny podpis

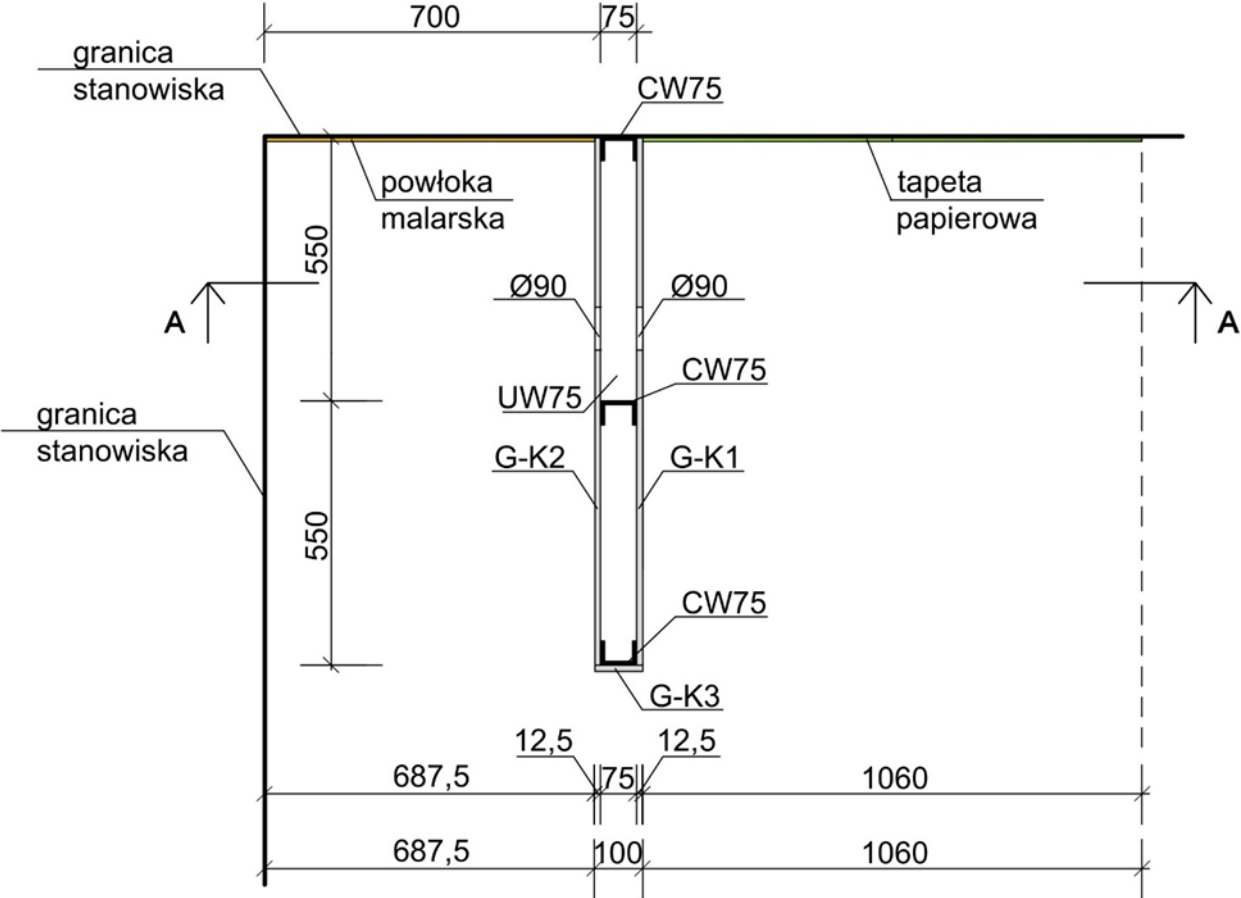


[wymiary w mm]

Rysunek 1. Rzut ściany działowej

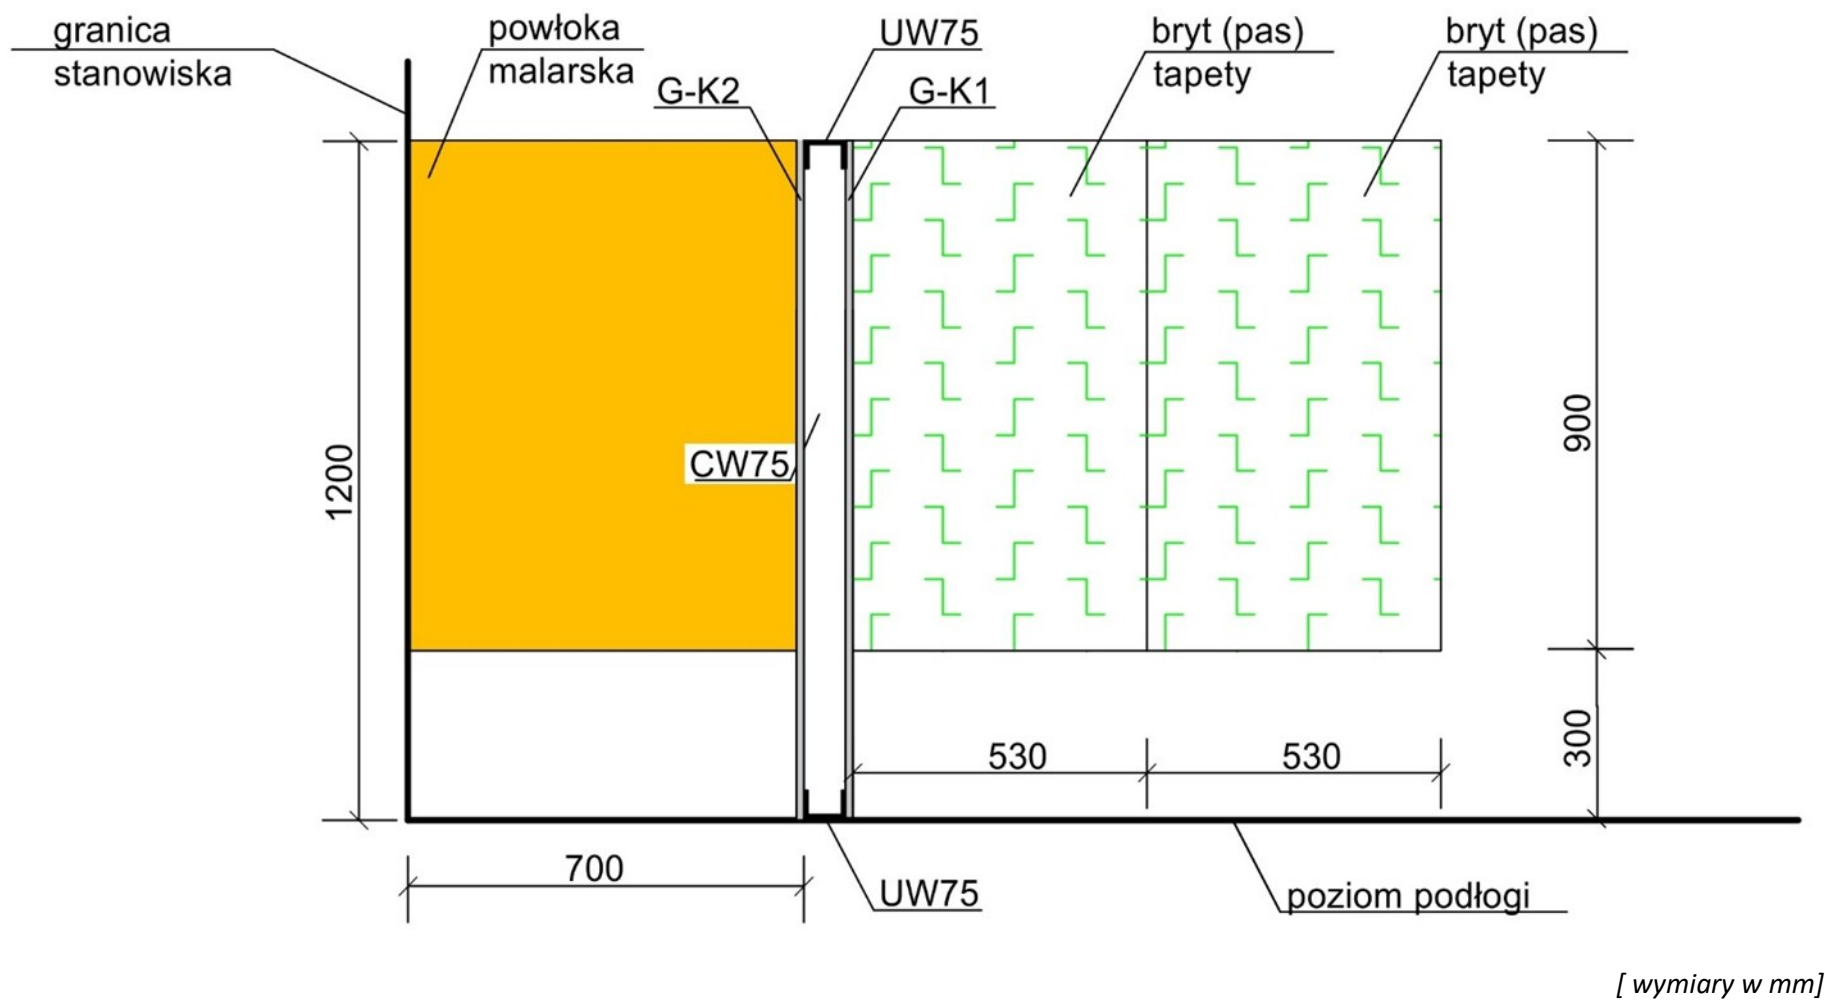

Rysunek 2. Przekrój A-A

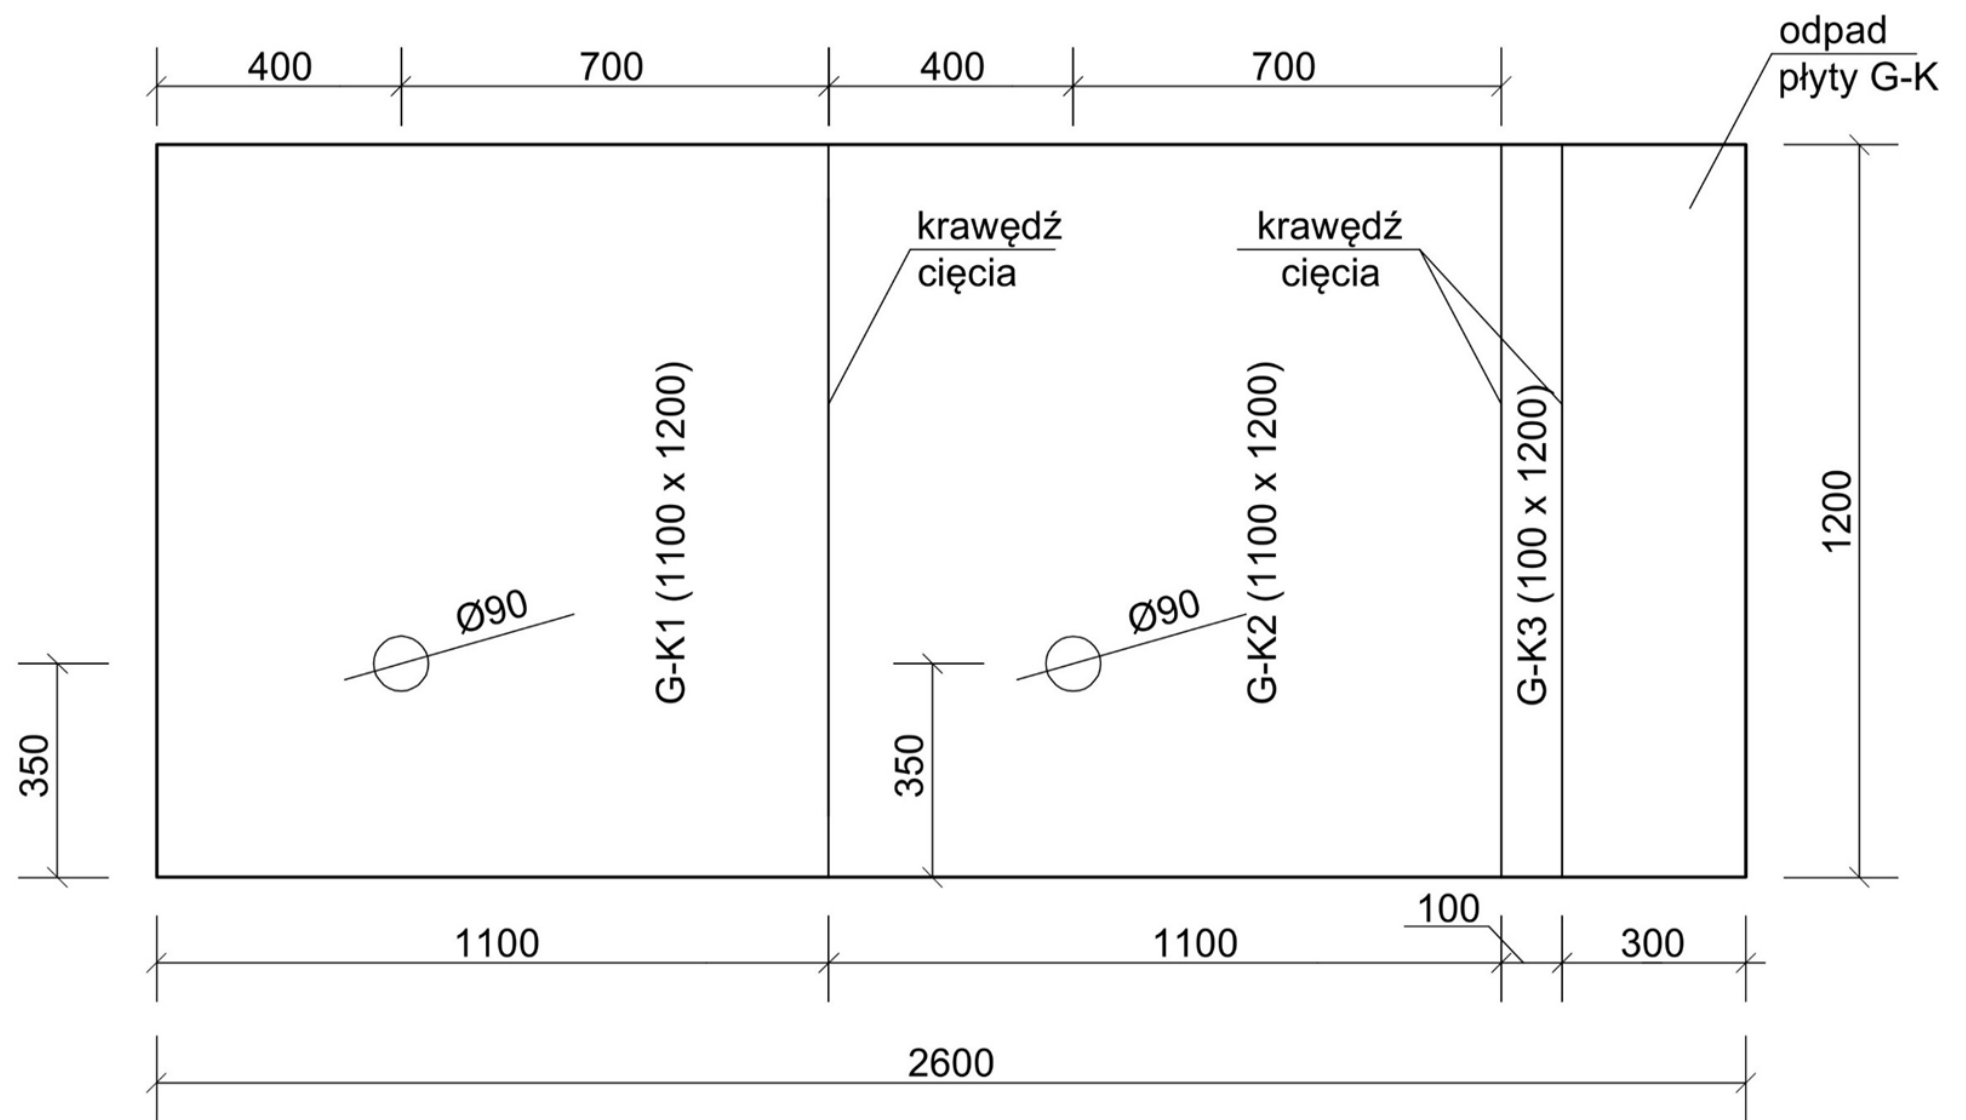

[wymiar w mm]

Rysunek 3. Schemat przygotowania płyt gipsowo-kartonowych
